

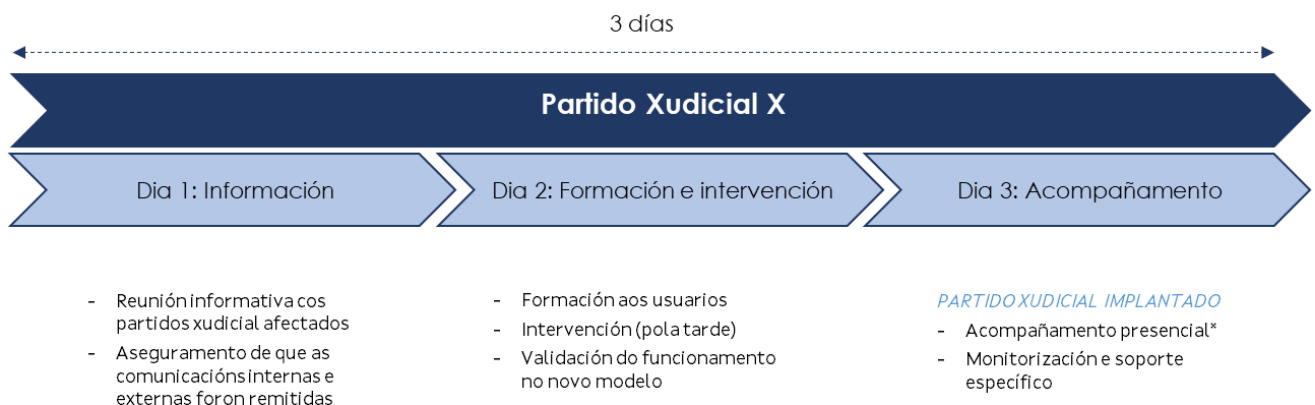
## PROPOSTA DE IMPLANTACIÓN DO NOVO MODELO ORGANIZATIVO DETERMINADO POLA LEI 1/2025 NOS PARTIDOS XUDICIAIS DA FASE I NA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA EN GALICIA – 06/06/2025

O presente documento recolle unha proposta de plan de implantación do novo modelo de organización das oficinas xudiciais de Galicia enmarcadas na Fase I da Lei 1/2025 unha vez completada a implantación piloto no partido xudicial de Cangas o día 02 de Xuño.

Para a elaboración desta planificación tivéronse en conta tanto criterios técnicos como organizativos e de xestión do cambio, así como as leccións aprendidas na implantación piloto, co fin de concretar unha planificación ambiciosa pero garantista que poida ser asumida e impulsada por todos os axentes e interesados implicados neste proceso.

### 1. PROCESO DE IMPLANTACIÓN EN CADA PARTIDO XUDICIAL

A implantación a levar a cabo en cada partido xudicial abordarase en tres días:




- Día 1.- Levarase a cabo unha reunión informativa por parte da Amtega na que se explicará o proceso a levar a cabo e á que se convidará a asistir aos LAX e Xuíces/Maxistrados do partido xudicial e na que se contará coa participación e apoio do secretario coordinador correspondente.
- Día 2:
  - Pola mañá impartiranse as sesións formativas sobre o impacto tecnolóxico derivado do NUMO a todos os usuarios da sede xudicial (formación telepresencial en dúas sesións de 1,5 horas).
  - Pola tarde levarase a cabo a intervención técnica en todos os sistemas afectados.




- Día 3: Co partido xudicial completamente operativo no novo modelo levaranse a cabo accións de soporte e acompañamento específicas, contándose cun apoio presencial en sede durante todo este día en todos os partidos xudiciais de 2 ou máis órganos.

## 2. PROPOSTA DE PLANIFICACIÓN

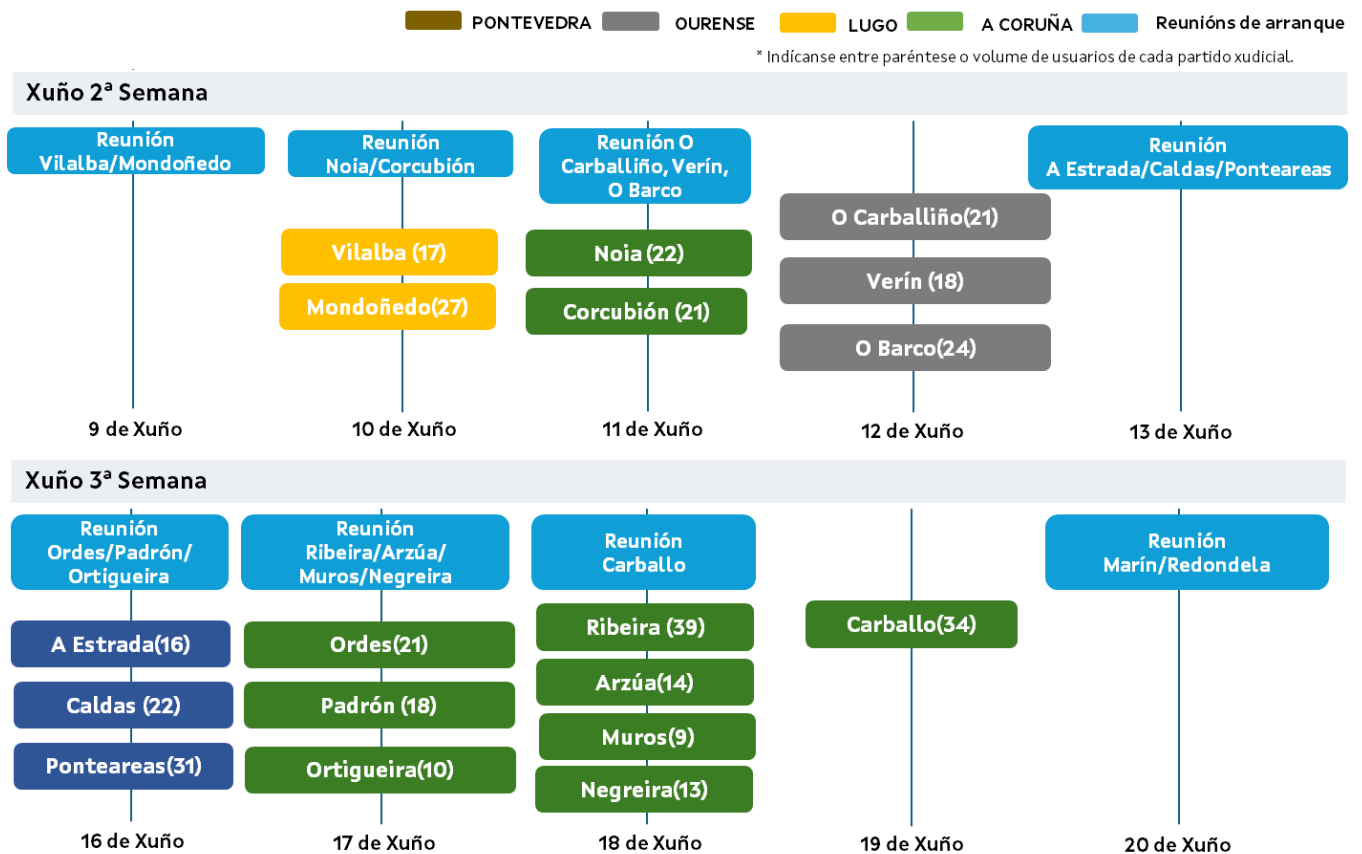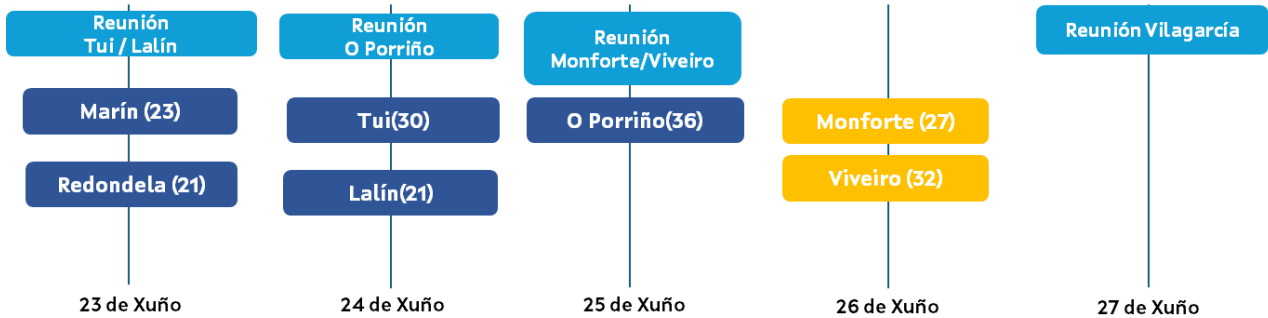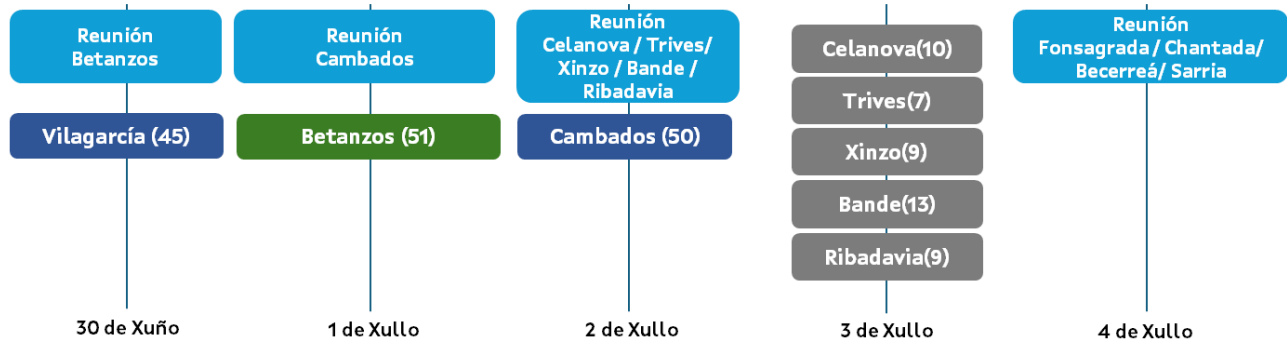A continuación detállase a planificación de implantación proposta para cada partido xudicial a cal permite que a totalidade de oficinas xudiciais pertencentes a partidos xudiciais con 2 ou máis órganos estea plenamente operativa no novo modelo o **día 3 de xullo** e a finalización da implantación en todos os xulgados da Fase I, incluíndo os xulgados únicos, o día **8 de xullo**.

### 2.1. PROPOSTA DE PLANIFICACIÓN GLOBAL



**Xuño 4ª Semana**

**Xuño 5ª Semana**

**Xullo 1ª Semana**


## 2.2. PROPOSTA DE PLANIFICACIÓN POR PROVINCIAS

### Lugo

PROVINCIA	PARTIDO XUDICIAL	NÚMERO ÓRGANOS	NÚMERO USUARIOS	REUNIÓN INICIAL	INTERVENCIÓN	ACTIVACIÓN /ACOMPANAMIENTO
LUGO	VILALBA	2	17	09/06/2025	10/06/2025	11/06/2025
LUGO	MONDOÑEDO	2	27	09/06/2025	10/06/2025	11/06/2025
LUGO	MONFORTE	2	27	25/06/2025	26/06/2025	27/06/2025
LUGO	VIVEIRO	2	32	25/06/2025	26/06/2025	27/06/2025

LUGO	A FONSAGRADA	1	7	04/07/2025	07/07/2025	N/A
LUGO	CHANTADA	1	12	04/07/2025	07/07/2025	N/A
LUGO	BECERREÁ	1	9	04/07/2025	07/07/2025	N/A
LUGO	SARRIA	1	13	04/07/2025	07/07/2025	N/A

## A Coruña

PROVINCIA	PARTIDO XUDICIAL	NÚMERO ÓRGANOS	NÚMERO USUARIOS	REUNIÓN INICIAL	INTERVENCIÓN	ACTIVACIÓN /ACOMPANAMIENTO
A CORUÑA	NOIA	2	22	10/06/2025	11/06/2025	12/06/2025
A CORUÑA	CORCUBIÓN	2	21	10/06/2025	11/06/2025	12/06/2025
A CORUÑA	ORDES	2	21	16/06/2025	17/06/2025	18/06/2025
A CORUÑA	PADRÓN	2	18	16/06/2025	17/06/2025	18/06/2025
A CORUÑA	ORTIGUEIRA	1	10	16/06/2025	17/06/2025	N/A
A CORUÑA	RIBEIRA	3	39	17/06/2025	18/06/2025	19/06/2025
A CORUÑA	ARZÚA	1	14	17/06/2025	18/06/2025	N/A
A CORUÑA	MUROS	1	9	17/06/2025	18/06/2025	N/A
A CORUÑA	NEGREIRA	1	13	17/06/2025	18/06/2025	N/A
A CORUÑA	CARBALLO	3	34	18/06/2025	19/06/2025	20/06/2025
A CORUÑA	BETANZOS	4	51	30/06/2025	01/07/2025	02/07/2025

## Ourense

PROVINCIA	PARTIDO XUDICIAL	NÚMERO ÓRGANOS	NÚMERO USUARIOS	REUNIÓN INICIAL	INTERVENCIÓN	ACTIVACIÓN /ACOMPANAMIENTO
OURENSE	O CARBALLIÑO	2	21	11/06/2025	12/06/2025	13/06/2025
OURENSE	VERIN	2	18	11/06/2025	12/06/2025	12/06/2025
OURENSE	O BARCO	2	24	11/06/2025	12/06/2025	17/06/2025
OURENSE	CELANOVA	1	10	02/07/2025	03/07/2025	N/A
OURENSE	TRIVES	1	7	02/07/2025	03/07/2025	N/A

OURENSE	XINZO	1	9	02/07/2025	03/07/2025	N/A
OURENSE	BANDE	1	13	02/07/2025	03/07/2025	N/A
OURENSE	RIBADAVIA	1	9	02/07/2025	03/07/2025	N/A

## Pontevedra

PROVINCIA	PARTIDO XUDICIAL	NÚMERO ÓRGANOS	NÚMERO USUARIOS	REUNIÓN INICIAL	INTERVENCIÓN	ACTIVACIÓN /ACOMPANAMIENTO
PONTEVEDRA	A ESTRADA	2	16	13/06/2025	16/06/2025	17/06/2025
PONTEVEDRA	PONTEAREAS	2	23	13/06/2025	16/06/2025	17/06/2025
PONTEVEDRA	CALDAS	2	22	13/06/2025	16/06/2025	17/06/2025
PONTEVEDRA	MARÍN	3	31	20/06/2025	23/06/2025	24/06/2025
PONTEVEDRA	REDONDELA	2	21	20/06/2025	23/06/2025	24/06/2025
PONTEVEDRA	TUI	3	30	23/06/2025	24/06/2025	25/06/2025
PONTEVEDRA	LALÍN	2	21	23/06/2025	24/06/2025	25/06/2025
PONTEVEDRA	O PORRIÑO	3	36	24/06/2025	25/06/2025	26/06/2025
PONTEVEDRA	VILAGARCÍA	3	45	27/06/2025	30/06/2025	01/07/2025
PONTEVEDRA	CAMBADOS	4	50	01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025
